



Rapport à mi-parcours 30 Juillet 2020

**29th Participants Committee Meeting (PC29)
And 13th Participants Assembly Meeting (PA13)**

Octobre 20-22, 2020



GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE



Plan de presentation

- **CONTEXTE NATIONAL**
- **CHRONOGRAMME DU PROCESSUS REDD+ EN RCA**
- **AUTO-ÉVALUATION PAR COMPOSANTE DU R-PP**
- **RÉSUMÉ DE LA DEMANDE DE FIANCEMENT ADDITIONNEL**
- **PERSPECTIVES**



Contexte national



La RCA compte 4,2 millions d'habitants, inégalement répartis sur une superficie de près de 623 000 km² (6,8 hab/km² en moyenne, avec de fortes disparités régionales).

Le pays comprend 28,3 Mha de forêt, soit près de 45 % de sa superficie. Ces forêts sont à 80 % des forêts de savane et à 20 % des forêts denses.

De premières hypothèses de travail ont été faites sur les causes sous-jacentes et facteurs directs de pression sur les forêts

Des études complémentaires ont été menées et leurs résultats ont été validés sur une base objective et de façon consensuelle entre toutes les parties prenantes du processus national REDD+.

L'impact de l'exploitation industrielle sur les forêts est analysé

Le mécanisme REDD+

REDD+: Réduction des Émissions issues de la **Déforestation**, de la **Dégradation** des forêts, et **le renforcement des stocks de carbone forestier**. Mécanisme d'accompagnement du développement économique soucieux de la préservation des écosystèmes forestiers.


- Agriculture familiale.
- Agriculture capitaliste et contractuelle.
- Exploitation minière artisanale.

- Exploitation (industrielle et artisanale) non-durable.
- Exploitation illégale.
- Bois-énergie non-durable

- Plantation forestière et agro-forestière.
- Reboisement des zones dégradées.
 - RNA

- Instabilité politique et conflits.
 - Pauvreté; Manque d'accès aux ressources financière.
- Absence de processus intersectoriel AT & manque de sécurisation foncière.
- Manque de ressources de l'Etat pour assurer ses fonctions d'accompagnement et de contrôle.

Chronogramme du processus REDD+ en RCA

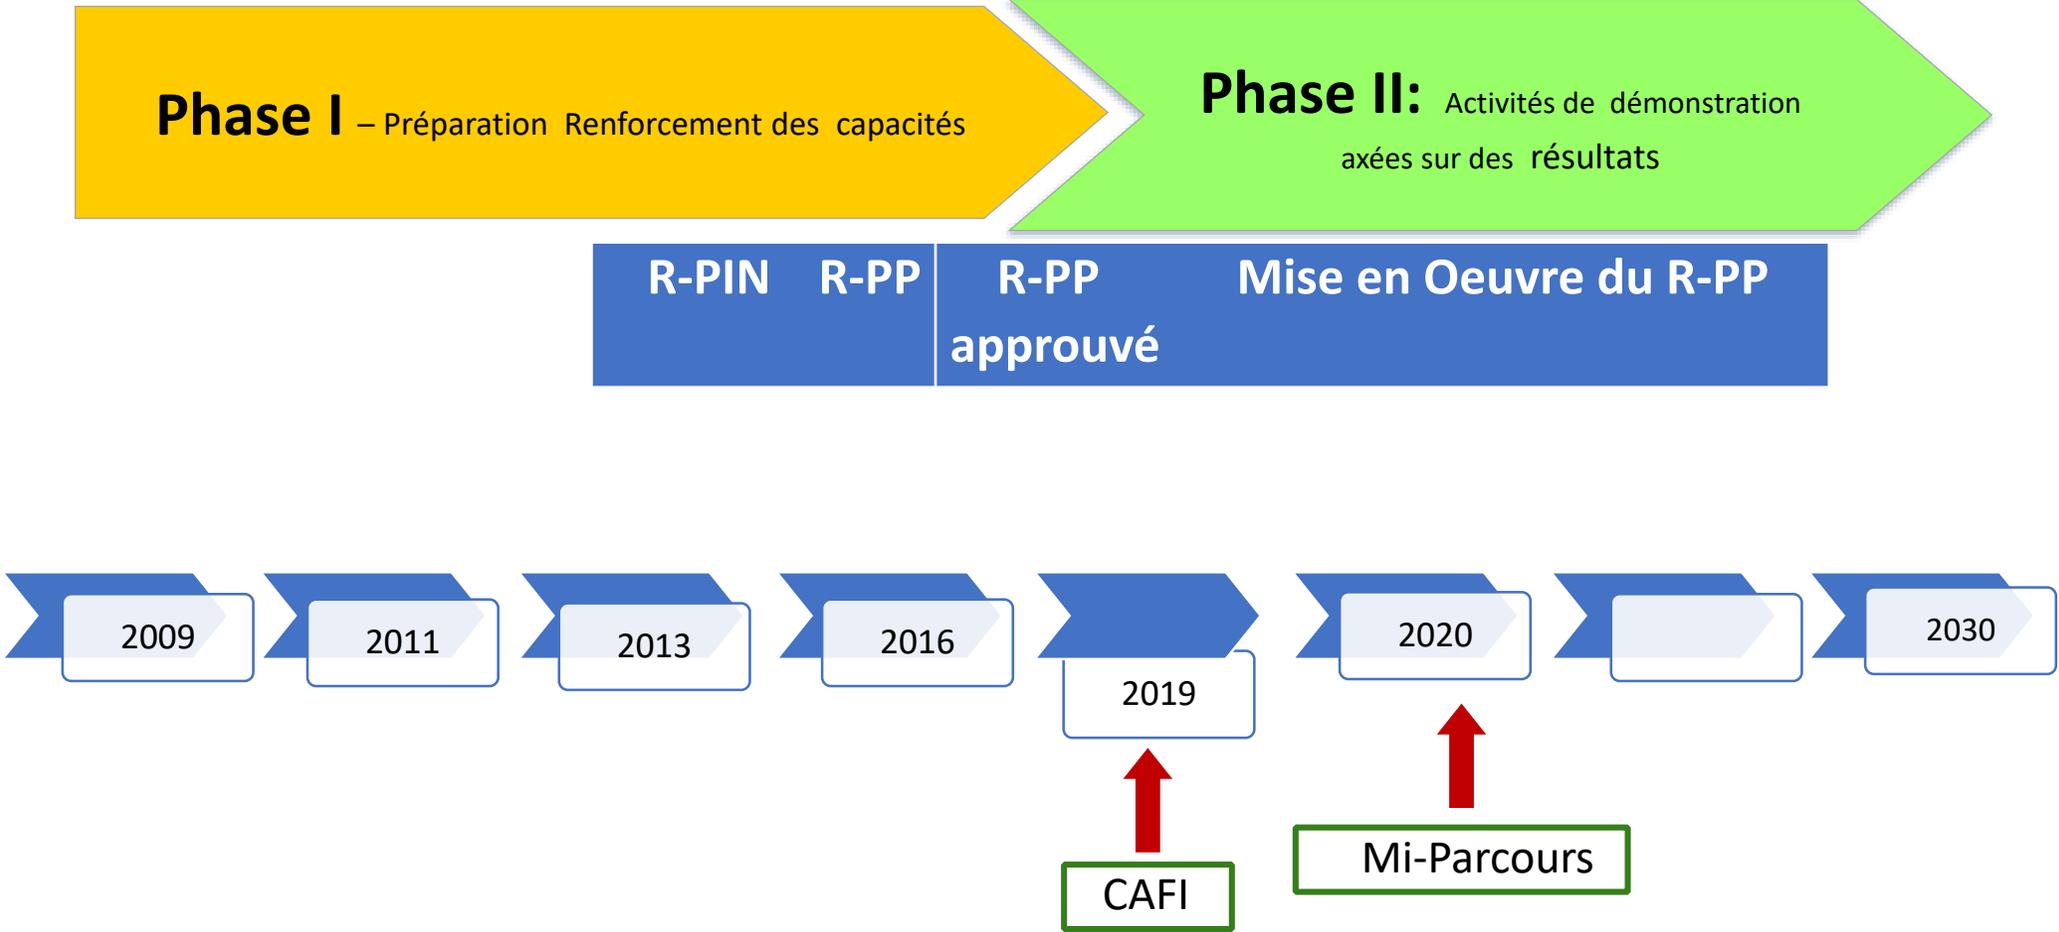

Auto-Evaluation par composante du R-PP

Comp	N°	Critères	Evaluation
1a	1	Responsabilisation et transparence	Yellow
	2	Mandat et budget opérationnels	Green
	3	Mécanismes de coordination multisectoriels et collaboration intersectorielle	Green
	4	Capacité de supervision technique	Yellow
	5	Capacité de gestion des fonds	Orange
	6	Mécanisme de remontée d'informations et de recours (Cf. MGPR)	Orange
1b	7	Participation et engagement des principales parties prenantes	Yellow
	8	Processus de consultation	Yellow
	9	Diffusion de l'information et accès à l'information	Yellow
	10	Utilisation et divulgation des résultats des consultations	Yellow
2a	11	Evaluation et analyse	Green
	12	Hiérarchisation des éléments favorables/défavorables, directs et indirects, à la mise en valeur des forêts	Green
	13	Liens entre ces éléments favorables/défavorables et les activités de REDD+	Green
	14	Plans d'action pour prendre en compte les droits aux ressources naturelles, les régimes fonciers et la gouvernance	Green
	15	Incidence sur les lois et politiques forestières	Green
2b	16	Sélection et hiérarchisation des options stratégiques de REDD+	Green
	17	Evaluation de la faisabilité	Green
	18	Incidences des options stratégiques sur les politiques sectorielles en vigueur	Green
2c	19	Adoption et application de lois et de réglementations	Orange
	20	Directives de mise en œuvre	Orange
	21	Mécanisme de partage des avantages	Orange
	22	Registre national REDD+ et système de suivi des activités REDD+	Red
2d	23	Analyse des questions relatives aux sauvegardes sociales et environnementales	Green
	24	Conception de la stratégie REDD+ en fonction des impacts	Green
	25	Cadre de gestion environnementale et sociale	Green
3	26	Démonstration de la méthode	Green
	27	Utilisation des données historiques et adaptation au contexte national	Yellow
	28	Faisabilité technique de l'approche méthodologique, et conformité aux directives de la CCNUCC et aux recommandations et lignes directrices du GIEC	Yellow
4a	29	Explication de la méthode de suivi	Yellow
	30	Démonstration des premières phases d'application	Orange
	31	Dispositifs et capacités institutionnels	Yellow
4b	32	Identification des aspects non liés au carbone et des problèmes sociaux et environnementaux pertinents	Green
	33	Suivi, notification et échange d'informations	Red
	34	Dispositifs et capacités institutionnels	Red

Cadre de suivi et d'évaluation

- Cadre de suivi et d'évaluation du R-PP de RCA et niveau d'avancement actuel et estimé à l'issue du don du Fonds de préparation du FCPF

Indicateurs	Moyens de vérification	Méthodes de collecte	Responsabilités	Risques et hypothèses	Vérification Indicateurs à mi-parcours (Mai 2020)	Estimation Indicateurs fin du don de préparation (Décembre 2020)
Evolution du bilan des GES entre 1990, 2000, 2010 et 2020	Inventaires des GES soumis à la CCNUCC et revu par des pairs	Demande auprès du Secrétariat de la CCNUCC	Gouvernement de RCA	Stratégie nationale REDD+ mise en œuvre, sous couvert de financements	Travaux concernant NERF en cours	NERF finalisé et soumis à la CCNUCC
CN, CT et CIP REDD+ créés et fonctionnels	Procès-verbaux des réunions de ces institutions Etat d'avancement du R-PP	Procès-verbaux Rapports d'évaluation externe	Institutions nationales REDD+ Bureau d'étude externe	Volonté politique intacte Pas de conflit de compétences	CN, CT et CIP REDD+ mis en place - Fréquences des réunions insuffisantes	
Niveau d'appropriation et de satisfaction concernant la stratégie nationale REDD+	Enquêtes de satisfaction	Questionnaires administrés à des panels représentatifs	Bureau d'étude externe	Pilotage de la stratégie nationale REDD+ par le seul Ministère en charge de l'Environnement	Stratégie Nationale REDD+ en cours de rédaction	Stratégie Nationale REDD+ finalisée et appropriée par les parties prenantes
Causes qualifiées Facteurs de pression quantifiés et spatialisés	Rapports d'études prévues dans la composante 2a	Mission de terrain dans des Préfectures clefs	CT REDD+	Disponibilité des données statistiques Mesurabilité de certains phénomènes	Etudes sur les causes de la déforestation réalisées - Compléments nécessaires (Centre, Nord RCA)	

Cadre de suivi et d'évaluation – a continué

Indicateurs	Moyens de vérification	Méthodes de collecte	Responsabilités	Risques et hypothèses	Vérification Indicateurs à mi-parcours (Mai 2020)	Estimation Indicateurs fin du don de préparation (Décembre 2020)
Une Loi REDD+ a été promulguée et est mise en œuvre	Loi REDD+ et textes d'application	Demande auprès du Secrétariat général du Gouvernement	AN et CN REDD+	Volonté politique intacte Pas de conflit de compétences	Décret instituant les trois organes institutionnels REDD+ (CN REDD+, CT REDD+, CIP REDD+) et la CNC, aucun autre texte réglementaire REDD+	
EESS effectuées et CGES fonctionnel	Rapports d'EESS et de CGES	Enquêtes de terrain	CT REDD+		Travaux concernant EESS et CGES en cours	EESS et CGES finalisés
Niveau de référence et méthodes d'élaboration	Niveau de référence soumis à la CCNUCC et revu par des pairs	Demande auprès du Secrétariat de la CCNUCC	Gouvernement de RCA	Méthodologie utilisée acceptée par la CCNUCC	Travaux concernant NERF en cours	NERF finalisé et soumis à la CCNUCC
Systèmes MNV "GES" et "autres aménités" fonctionnels	Rapports de vérification des deux systèmes MNV	Demande auprès du Secrétariat de la CCNUCC	Gouvernement de RCA	Méthodologie utilisée acceptée par la CCNUCC	Travaux concernant le système SNSF/MNV en cours, rien pour « autres aménités »	Système SNSF/MNV finalisé et soumis à la CCNUCC, rien pour « autres aménités »

Analyse des progrès effectués dans les activités financées par le don du Fonds de préparation du FCPF

Année	Prévisionnel PTBA	Décaissé du don FCPF (au 15/05/2020)	Engagement d'après PTBA 2020	Décaissé du don FCPF prévisionnel*
2017	-	524 476	-	524 476
2018	3 564 700	541 113	-	541 113
2019	3 394 800	80 299	-	80 299
2020	1 814 374	714 350	729 523	1 443 873
TOTAL (USD)		1 860 237	729 523	2 589 760
Taux décaissement actuel (au 15/05/2020)				49%
Taux décaissement prévisionnel*				68%
Ressources estimées non utilisées du don FCPF (USD)				1 210 240

* A la date de clôture du don FCPF fixée au 31/12/2020 si l'ensemble des dépenses du PTBA 2020 sont réalisées

Matrice consolidée et actualisée des financements de préparation à la REDD+ en RCA

Utilisation des fonds (en k USD)						
Composante de la R-PP	Total requis (A)	Fonds promis (B)	Fonds utilisés		Fonds disponibles (= C - D)	Déficit de financement d'après R-PP (= A - C)*
			Fonds engagés (C)	Fonds décaissés (D)		
Composante 1a : Dispositifs nationaux	1 720	974	643	573	70	1 078
Don FCPF	1 691	974	643	573	70	
FEM/BM	30					
Composante 1b : Consultations R-PP	74	0	0	0	0	0
Don FCPF	74	0	0	0		
Composante 1c : Consultations participation	507	317	183	43	140	323
Don FCPF	384	317	183	43	140	
FEM/BM	53					
PFBC/BAD/FAO	70					
Sous-total Composante 1	2 301	1 290	826	616	465	1 401

Utilisation des fonds (en k USD)						
Composante de la R-PP	Total requis (A)	Fonds promis (B)	Fonds utilisés		Fonds disponibles (= C - D)	Déficit de financement d'après R-PP (= A - C)*
			Fonds engagés (C)	Fonds décaissés (D)		
Composante 2a : Utilisation des terres	411	0	0	0	0	0
Don FCPF	321	0				
FEM/BM	90					
Composante 2b : Options stratégiques	15 550	3 079	2 578	1 624	954	0
Don FCPF	850	1 000	499	149	350	
Gouvernement RCA	800					
FFEM/AFD (PDRSO**)	4 550	2 079	2 079	1 475	604	
PFBC/BAD/FAO	2 750					
Autres sources à identifier	6 601					
Composante 2c : Cadre de mise en œuvre	76	0	0	0	0	76
Don FCPF	76	0				

Utilisation des fonds (en k USD)						
Composante de la R-PP	Total requis (A)	Fonds promis (B)	Fonds utilisés		Fonds disponibles (= C - D)	Déficit de financement d'après R-PP (= A - C)*
			Fonds engagés (C)	Fonds décaissés (D)		
Composante 2d : Impacts Env. & Sociaux	215	430	334	33	301	0
Don FCPF	205	430	334	33		
FEM/BM	10					
Sous-total Composante 2	16 252	3 509	2 913	1 658	1 255	76
Composante 3 : Niveau de référence	945	800	910	229	681	0
Don FCPF	0	800	910	229		
Autres sources à identifier	945					
Sous-total Composante 3	945	800	910	229	681	0
Composante 4a : MNV	1 127	0	0	0	0	0
Don FCPF	0	Inclus Comp. 3				

Utilisation des fonds (en k USD)						
Composante de la R-PP	Total requis (A)	Fonds promis (B)	Fonds utilisés		Fonds disponibles (= C - D)	Déficit de financement d'après R-PP (= A - C)*
			Fonds engagés (C)	Fonds décaissés (D)		
PFBC/BAD/FAO	63					
Autres sources à identifier	1 064					
Composante 4b : Avantages multiples	208	0	0	0	0	208
Don FCPF	0					
Autres sources à identifier	208					
Sous-total Composante 4	1 335	0	0	0	0	208
Gestion de projet Don FCPF	0	50	21	21	0	0
TOTAL	20 833	5 649	4 669	2 523	2 401	1 685
Sources des fonds (en k USD)						

Le CNI financé par le CAFI est un outil qui permettra de mobiliser d'importants financements dans les cinq prochaines années pour la mise en œuvre de la REDD+. Selon l'adage « on apprend en faisant », la finalisation des dernières activités de préparation à la REDD+, essentiellement d'ordre institutionnel et organisationnel (Cf. section 2.2.3 supra), pourra se faire de manière concomitante aux premiers projets de mise en œuvre de la REDD+.

CONCLUSION

- Finalisation et livraison des éléments du R-Package (Stratégie Nationale, CGES, MRV, etc.) d'ici le 15 décembre 2020.

